



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+”



Bytom, marzec 2018 r.

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Harmonogram monitoringu GPR. Bytom 2020+	6
3. Sprawozdanie z realizacji GPR. Bytom 2020+ (stan na dzień 28.03.2018 r.).....	9
4. Ocena stopnia aktualności zapisów GPR. Bytom 2020+	16
5. Podsumowanie	17
Spis rysunków	19
Spis tabel	19
Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR. Bytom 2020+ (stan na dzień 28.03.2018 r.)	

1. Wstęp

W 2016 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę Nr XXIII/300/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytom¹. Jako obszar rewitalizacji wskazano 6 jednostek zamieszkałych przez 28,97% mieszkańców miasta oraz 9 jednostek przemysłowych, który łącznie zajmuje 828 ha, co stanowi 11,93% powierzchni miasta.

Tabela 1. Ludność obszaru rewitalizacji (2015 r.)

Obszar	ID obszaru	Osoby zameldowane	% populacji miasta
OBSZAR REWITALIZACJI		45 991	28,97%
W tym:			
Bobrek	8	4 664	2,94%
Śródmieście	10	13 060	8,22%
Śródmieście Zachód	11	8 610	5,42%
Rozbark	12	7 904	4,98%
Śródmieście Północ	13	11 601	7,31%
Kolonia Zgorzelec	19	152	0,10%

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 38

Tabela 2. Powierzchnia obszaru rewitalizacji

Obszar	ID obszaru	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
MIASTO BYTOM		6 944	100,00%
RAZEM OBSZAR REWITALIZACJI - OBSZARY ZAMIESZKAŁE I POPRZEMYSŁOWE		828	11,93%
OBSZARY ZAMIESZKAŁE			
Bobrek	8	49	0,71%
Śródmieście	10	90	1,30%
Śródmieście Zachód	11	61	0,88%
Rozbark	12	76	1,09%
Śródmieście Północ	13	133	1,92%
Kolonia Zgorzelec	19	7	0,10%
RAZEM OBSZARY ZAMIESZKAŁE		416	6,00%
OBSZARY POPRZEMYSŁOWE			
Teren dawnej KWK Rozbark	24	15	0,22%
Teren dawnej KWK Szombierki	25	64	0,92%
Teren dawnej Huty Zygmunt	26	39	0,56%
Teren KWK Centrum	27	44	0,63%
Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice	28	39	0,56%
Teren dawnej Huty Bobrek	29	56	0,81%
EC Szombierki + Pola Szombierskie	30	44	0,63%
Rezerwat przyrody „Żabie Doły”	31	41	0,59%
Tereny przemysłowe „Orzeł Biały”	32	70	1,01%
RAZEM OBSZARY POPRZEMYSŁOWE		412	5,93%

Źródło: Opracowanie Instytutu Rozwoju Miast, „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 37

¹ http://bytomodnowa.pl/uploads/docs/XXIII_300_16.pdf, 27.03.2018 r.

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” przygotowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566) oraz w zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 r. Opracowany dokument w styczniu 2017 r. zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji przekazano odpowiednim instytucjom do zaopiniowania. Uzyskano pozytywnie opinie nt. projektu dokumentu, również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała pozytywną decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W lutym 2017 r. „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu – podstawę prawną niniejszego dokumentu stanowi uchwała Nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” – natomiast 22 marca 2017 r. został on wpisany do Wykazu programów rewitalizacji woj. śląskiego (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_województwa_slaskiego).

Ostateczna wersja dokumentu wraz z uchwałą dostępna jest na stronie:

- ❑ Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Gminny_Program_Rewitalizacji%20_Bytom_2020+_luty_2017.pdf

- ❑ Załącznik 1 – Mapa „Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/GPR_luty%202017_za%C5%82.1_mapa.pdf

- ❑ Załącznik 2 – „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Lista%20przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87%20do%20GPR%20_luty%202017_za%C5%82.%202.pdf


- ❑ Załącznik 3 – „Matryca logiczna”

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Matryca%20logiczna_luty%202017_za%C5%82.%203.pdf

- ❑ Uchwała Nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”


http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXXVIII_487_17.pdf

Rysunek 1. Uchwała Rady Miejskiej – GPR. Bytom 2020+



Źródło: <http://bytomodnowa.pl/gminny-program-rewitalizacji-bytom-2020>, 27.03.2018 r.

Rysunek 2. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (Załącznik Nr 1 do GPR. Bytom 2020+)

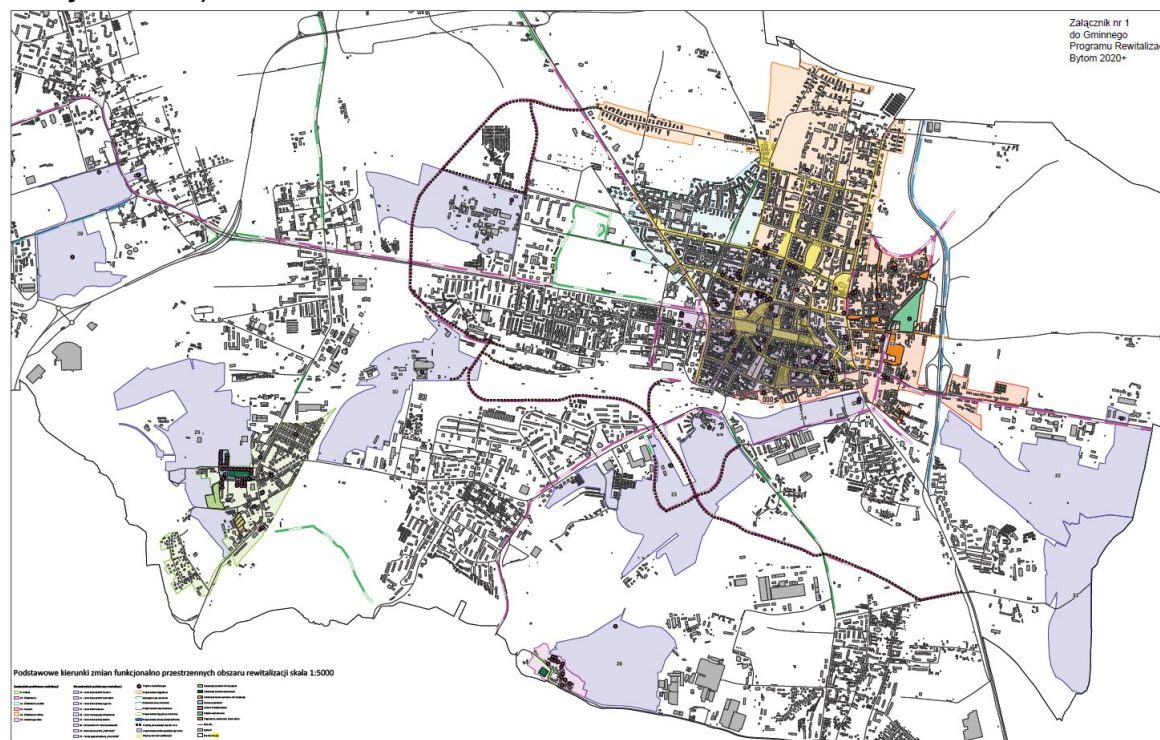

Źródło:

http://bytomodnowa.pl/uploads/news/Gminny%20Program%20Rewitalizacji/GPR_luty%202017_zac%201_mapa.pdf, 27.03.2018 r.

W GPR. Bytom 2020+ zapisano projekty tworzące listę podstawową (Załącznik nr 2 - „Lista przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”) oraz uzupełniającą do programu rewitalizacji. GPR. Bytom 2020+ zakłada realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych - do załącznika nr 2 wpisano 127 projektów rewitalizacyjnych, który przedstawia ich szczegółową charakterystykę. Dodatkowo załącznik nr 1 (mapa) obrazuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną przedstawiającą m.in. podział na zamieszkałe i niezamieszkałe podobszary rewitalizacji, lokalizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych czy planowane inwestycje.

„Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” obejmuje perspektywę programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument jest jednym z obligatoryjnych załączników do wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

2. Harmonogram monitoringu GPR. Bytom 2020+

Zgodnie z założonym harmonogramem monitorowanie wskaźników odbywać się będzie cyklicznie – wskaźniki podzielono na dwie grupy:

- **wskaźniki realizacji celów operacyjnych** - zakłada się monitorowanie wskaźników celów operacyjnych, co dwa lata. Przy czym pierwszy monitoring realizacji celów planuje się na 2019 rok (do końca I kwartału),
- **wskaźniki projektów** – monitorowanie projektów odbywać się będzie na podstawie sprawozdań rocznych bądź końcowych dostarczanych przez wnioskodawców zgłaszających swoje projekty w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”.

Raport z monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” będzie przygotowywany, co roku, zawsze do końca I kwartału roku następnego i przedkładany do zaopiniowania.

Tabela 3. Harmonogram monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”

	FORMA	OKRES
SPRAWOZDAWCZOŚĆ	<ul style="list-style-type: none"> - do 15 lutego roku następnego - sprawozdania częściowe przygotowywane przez beneficjentów projektów wpisanych do „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, - do 30 marca roku następnego – sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ na podstawie sprawozdań częściowych 	Co roku – pierwszy do 30 marca 2018 r.
MONITORING	<ul style="list-style-type: none"> - do 30 marca co dwa lata – raport na podstawie wskaźników realizacji celów operacyjnych. Wartości zbierane od wydziałów i jednostek raz na dwa lata. 	Co dwa lata - pierwszy do 30 marca 2019 r.
EWALUACJA	Bieżąca analiza wpływu podejmowanych działań rewitalizacyjnych na realne zmiany sytuacji obszaru. Zlecenie ekspertyz dot. oceny sytuacji w obszarze rewitalizacji (działania planowane w ramach pilotażu)	Korekty GPR będą wprowadzane w miarę potrzeb nie częściej niż raz do roku.

Zródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 202

Monitoring realizacji programu stanowi nawiązanie do wykonanych w ramach prac nad GPR diagnoz, w szczególności problemów, których łagodzenie zakłada się w procesie rewitalizacji. Wskaźniki wykorzystywane w monitoringu dotyczą osiągnięcia zdefiniowanych celów oraz oceny sytuacji na obszarach poddanych rewitalizacji.

Monitorowanie służy zagwarantowaniu realizacji celów operacyjnych określonych w Programie (monitoring rzeczowy) oraz odpowiedniej absorpcji środków nań przewidzianych (monitoring finansowy). Mierzeniu postępu realizacji celów oraz ocenie efektywności wdrażania w ujęciu rzeczowym i finansowym służą wskaźniki Programu. Przedstawiony poniżej system monitorowania uwzględnia współfinansowanie projektów ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Z monitoringiem ściśle związana jest sprawozdawczość, obejmująca zbieranie informacji dotyczących wdrażania Programu z uwzględnieniem celów i działań w postaci danych liczbowych, finansowych, wskaźników i innego rodzaju informacji oraz przekazywanie ich odpowiednim podmiotom w określonej formie i terminach dla potrzeb monitorowania celów i efektów rzeczowych. Tabela 4 prezentuje system wskaźników służących określaniu poziomu realizacji celów GPR.

Tabela 4. Wskaźniki realizacji celów GPR

CEL STRATEGICZNY 1 Utworzenie konkurencyjnej struktury gospodarczej, opartej na przedsiębiorczości mieszkańców, zapewniającej atrakcyjne miejsca pracy	
CEL OPERACYJNY 1.1 Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców kompensujący niedobory miejsc pracy w mieście	1. Liczba osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, które założyły własną firmę (↗), 2. Liczba ofert pracy zgłaszanych do PUP przez bytomskie firmy (↗), 3. Liczba projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji przez podmioty z różnych sektorów w zakresie promocji samozatrudnienia (↗).
CEL OPERACYJNY 1.2 Dogodne warunki dla rozwoju firm lokalnych	4. Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG na 100 osób (↗), 5. Stosunek między liczbą firm nowo rejestrowanych a liczbą firm wyrejestrowanych w CEIDG (↗).
CEL OPERACYJNY 1.3 Wysoki poziom dostępności udogodnień umożliwiających podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, usuwanie barier w powrocie na rynek pracy oraz wzrastający poziom motywacji wewnętrznej mieszkańców w zakresie realizacji karier zawodowych	6. Liczba bezrobotnych w przedziałach wiekowych: do 30 roku życia, powyżej 30 roku życia, powyżej 50 roku życia na obszarze rewitalizacji (↘), 7. Bezrobocie w obszarach rewitalizacji według czasu pozostawania bez pracy (↘): - liczba osób pozostających bez pracy 12-24 mies., - liczba osób pozostających bez pracy pow. 24 mies., 8. Liczba osób dotkniętych bezrobociem długotrwałym kwalifikowanych przez Urząd Pracy jako tzw. profil III, (↘) 9. Stosunek liczby dzieci w wieku przedszkolnym do liczby miejsc w przedszkolach (↘).
CEL STRATEGICZNY 2 Przywrócona spójność społeczna i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych	
CEL OPERACYJNY 2.1 Ograniczona skala negatywnych zjawisk społecznych oraz wzrost dostępności do prorozwojowych usług publicznych	10. Liczba beneficjentów wszystkich rodzajów pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców (↘), 11. Liczba osób pobierających zasiłki celowe na 1 tys. mieszkańców (↘), 12. Liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z dożywiania (↘).
CEL OPERACYJNY 2.2 Społeczności lokalne zintegrowane wokół tradycji dzielnic oraz oddolnych inicjatyw realizowanych przez mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej	13. Liczba projektów obywatelskich zgłaszanych przez mieszkańców rewitalizowanych dzielnic (np. do budżetu obywatelskiego miasta) (↗), 14. Liczba organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury i spraw społecznych (= lub ↗), 15. Aktywność organizacji wyrażona wielkością dotacji udzielonych organizacjom na zadania w dziedzinie kultury (↗), 16. Liczba klubów sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych działających na rewitalizowanym obszarze (= lub ↗), 17. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (↗), 18. Frekwencja w wyborach samorządowych (↗).

CEL STRATEGICZNY 3	
Funkcjonalna i estetyczna atrakcyjność przestrzeni publicznych, w których realizowane są działania integrujące społeczności lokalne oraz decydujące o witalności i wizerunku miasta	
CEL OPERACYJNY 3.1 Odpowiadająca współczesnym standardom cywilizacyjnym jakość zabudowy na obszarach rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za komunalny zasób mieszkaniowy	19. Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych (↗), 20. Ilość zlikwidowanych źródeł niskiej emisji (↗), 21. Odsetek należących do gminy budynków według szacowanego stanu technicznego budynków (szacowany w pięciostopniowej skali: ↘ dla zasobów w złym stanie technicznym, ↗ dla zasobów w dobrym stanie technicznym), 22. Średnie zadłużenie w lokalach w zasobie mieszkaniowym gminy z przyznanymi zasiłkami celowymi (↘).
CEL OPERACYJNY 3.2 Partnerstwo władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych	23. Udział powierzchni terenów zielonych na obszarze rewitalizacji (↗).
CEL OPERACYJNY 3.3 Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniany przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej	24. Liczba przestępstw ogółem na 10 tys. mieszkańców (↘), 25. Liczba czynów karalnych osób niepełnoletnich (↘), 26. Liczba przypadków przemocy w rodzinie na 10 tys. mieszkańców (↘).
CEL STRATEGICZNY 4	
Ożywienie terenów zdegradowanych dostarczających funkcji i udogodnień umożliwiających mieszkańcom rozwój społeczny i ekonomiczny	
CEL OPERACYJNY 4.1 Zrekultywowane tereny poprzemysłowe przygotowane na przyjęcie nowych funkcji ważnych dla poprawy sytuacji społecznej i rozwoju rynku pracy	27. Powierzchnia terenów inwestycyjnych utworzonych w oparciu o tereny rekultywowane (↗), 28. Liczba przedsiębiorstw podejmujących działalność na zrekultywowanych terenach przeznaczonych na cele inwestycyjne (↗).
CEL OPERACYJNY 4.2 Przywrócona wartość obiektów historycznych, kulturowych, krajobrazowo-przyrodniczych, przyczyniająca się do wzmacniania tożsamości społeczności lokalnych	29. Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody (↗), 30. Powierzchnia zrekultywowanych terenów (↗), 31. Powierzchnia obiektów, które zostały przystosowane do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (do 2018 r. ↗, po 2018 r. =), 32. Liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem (↗).

Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 202-204

Wdrażanie GPR opiera się na realizacji wypracowanych partnersko projektów. Projekty zawarte w bytomskim „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” oraz projekty, które do programu będą wprowadzane powiązane są w większości z osiaganiem wskaźników określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W sytuacji, gdy na obszarach rewitalizacji podejmowane będą konkretne projekty mające związek z poniższymi wskaźnikami produktu i rezultatu prowadzony będzie monitoring wybranych wskaźników.

3. Sprawozdanie z realizacji GPR. Bytom 2020+ (stan na dzień 28.03.2018 r.)

Zgodnie z założonym harmonogramem monitorowania „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” (szczegółowa procedura scharakteryzowana w rozdziale 2 niniejszego opracowania) do końca I kwartału 2018 r. przeprowadzono monitoring oraz opracowano sprawozdanie z realizacji GPR. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania (rys. 3) jest zestawienie tabelaryczne sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do GPR – „Listy przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. W szczególności zostało ono wykonane w oparciu o zestawienia cząstkowe przygotowywane przez Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich oraz sprawozdania cząstkowe przekazane przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wszystkie podmioty, których projekty wpisano do GPR zostały poproszone o podanie informacji na temat realizowanych projektów tj.:

- **rzeczywista wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem (w zł.),**
- **okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem,**
- **rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem,**
- **stan przygotowania, etap oceny projektu,**
- **ostateczny termin złożenia wniosku.**

Ww. podpunkty stanowią jednocześnie tytuły kolumn w zestawieniu (rys. nr 3 - kolor biały/zielony) – kolumny przedstawiają zaktualizowaną informację nt. realizacji poszczególnych projektów wobec danych zapisanych w zał. nr 2 do GPR (kolor szary). Utworzono również kolumnę pt. „Uwagi”, w której wpisano dodatkowe informacje o przedsięwzięciu. Kolorem zielonym wyróżniono kolumnę prezentującą „stan przygotowania, etap oceny projektu” – szczególnie ważna dla procesu sprawozdawczego. Obrazuje ona, które projekty:

- nie zostaną złożone/zrealizowane,
- są w trakcie przygotowania,
- zostały złożone: ocena formalna, ocena merytoryczna,
- zostały wybrane do dofinansowania,
- mają podpisaną umowę o dofinansowanie.

Rysunek 3. Wycinek – monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Załącznik do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+ - ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GPR. BYTOM 2020+ (STAN NA DZIEŃ 28.03.2018 r.)												
lp	nazwa	podmiot realizujący	Źródło finansowania oraz dane o formie poddofinansowania programu operacyjnego	szacowana całkowita wartość (w zł)	rzeczywista wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem (w zł)	okres realizacji	okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem	wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) w sposób monitorowania	rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) zgodnie ze złożonym wnioskiem	stan przygotowania, etap oceny projektu	uwagi	ostateczny termin złożenia wniosku
INTERWENCJA SPOŁECZNA												
1	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytoma poprzez aktywizację zawodową - etap I	Rpowiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 2.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających w trybie pozostających bez zatrudnienia - konkurs	2 913 004,00	1 011 305,98	II kw. 2017 - I kw. 2019	2018-05-01 - 2020-04-30	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 64 osoby. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 50 osób. Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 300 osób. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 50 osób. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10 osób. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 20 osób. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 100 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: system SYRUSZ, rejestry PUP.	Wskaźniki produktu: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 20 osób. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 100 osób. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 324 osoby. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 47 osób. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10 osób. Wskaźnik rezultat: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 81 osób. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 17 osób. Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ICD3) i niepełniących, którzy podjęli pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnienia) - 30%. Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podjęli pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnienia) - 30%.	ZŁOŻONY pozytywna ocena merytoryczna wybrany do dofinansowania	Rzeczywiste wskaźniki projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem - wskaźniki rezultatu w wieku 50 lat i więcej, którzy podjęli pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnienia) - 30%. Odsetek uczestników, które podjęli pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność zatrudnienia) - 30%.	16.10.2017
2	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytoma poprzez aktywizację zawodową - etap II	Rpowiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	RPO WSL - OSI 2.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających w trybie pozostających bez zatrudnienia - konkurs	3 452 105,04		II kw. 2018 - I kw. 2021		Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 64 osoby. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10 osób. Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 453 osoby. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 50 osób. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10 osób. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 20 osób. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 100 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: system SYRUSZ, rejestry PUP.		wniosek o dofinansowanie nie został złożony	wniosek o dofinansowanie planowany do złożenia w późniejszym terminie - tematykę zagwarantowania niedofinansowania wniosku	

Źródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

Do załącznika nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ wpisano 127 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednakże na potrzeby monitoringu dokonano podziału projektów ze względu na różnorodność źródeł finansowania tj. projekty finansowane:

- z RPO WSL 2014-2020 (tab. 5) – 120 projektów;
- z innych źródeł niż RPO WSL 2014-2020 (tab. 10) – 7 projektów.

Tabela 5. Projekty finansowane z RPO WSL 2014-2020 (zgodnie z zał. nr 2 do GPR. Bytom 2020+)

STAN REALIZACJI WNIOSKÓW	LICZBA WNIOSKÓW (stan na marzec 2018 r.)
Wniosek o dofinansowanie nie zostanie złożony – projekt nie zostanie zrealizowany	5
Wniosek o dofinansowanie nie został złożony , w tym:	52
• Wnioski o dofinansowanie w trakcie przygotowania	25
Wniosek o dofinansowanie został złożony , w tym:	57
• Wnioski negatywnie ocenione	1
• Projekty wybrane do dofinansowania (w tym liczba podpisanych umów o dofinansowanie)	16 (5)
Brak informacji o projekcie	6
RAZEM	120

Źródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

W ramach dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 (tab. 5) planowane do złożenia pozostały jeszcze 52 wnioski, z których 25 jest w trakcie przygotowania (tab. 7). Decyzją wnioskodawców 5 projektów nie zostanie złożonych o dofinansowanie (tab. 6), natomiast złożonych zostało 57 wniosków, z pośród których 1 otrzymał negatywną ocenę merytoryczną – *Remont konserwatorski elewacji budynku plebani kościoła p.w. Św. Trójcy w Bytomiu zlokalizowanego przy ul. Kwietniewskiego 1* (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu). Niewykorzystane środki przeznaczone dla niniejszego przedsięwzięcia zostały przesunięte na realizację projektu pt. *Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark* (Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania). Dodatkowo 16 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wybrano do dofinansowania, a dla 5 z nich została podpisana umowa o dofinansowanie projektu – wyróżnione kolorem zielonym w tabeli nr 8.

Tabela 6. Projekty, dla których podmioty realizujące wycofały się z realizacji

ZAŁ. NR 2 DO GPR. BYTOM 2020+			
LP.	Nr projektu w GPR	NAZWA PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY
1.	6	Lepszy start, praca, lepsze jutro	TSL Silesia Sp. z o.o.
2.	10	Bytomianie pracują w bytomskich przedsiębiorstwach	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
3.	22	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Opiekunka 8.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
4.	41	Ludzie do ludzi – Program Aktywizacji Lokalnej mieszkańców Bobrka	Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP
5.	69	Bytomianie pomagają seniorom	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

Źródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

Tabela 7. Projekty w trakcie przygotowania

ZAŁ. NR 2 DO GPR. BYTOM 2020+			
LP.	Nr projektu w GPR	NAZWA PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY
1.	8	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie 7.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
2.	16	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia 7.3.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
3.	19	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement 7.4.2	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
4.	31	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego II	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR
5.	32	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego III	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR
6.	33	Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego IV	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR
7.	44	Centrala Bytom	Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu
8.	45	Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - rozwój interpersonalny osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym	Klub Sportowy Skarpa Bytom
9.	47	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja 9.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Centrum Integracji Społecznej CIS Bytom oraz EMAT Wolsztyn
10.	68	Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - opieka krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży, pomoc dydaktyczna dla rodzin oraz aktywacja osób starszych	Klub Sportowy Skarpa Bytom
11.	71	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa 9.2.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
12.	74	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Przedszkolna 11.1.3	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
13.	78	Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa 11.1.4	FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn
14.	90	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
15.	96	Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
16.	99	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
17.	101	Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych celem adaptacji na lokale socjalne Zmiana nazwy: Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania

18.	105	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
19.	106	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
20.	107	Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji we współpracy z Urzędem Miejskim
21.	108	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
22.	109	Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania
23.	112	Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. Ks. Koziółka 3	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
24.	117	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu	Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
25.	118	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania

Zródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

Tabela 8. Projekty wybrane do dofinansowania

ZAŁ. NR 2 DO GPR. BYTOM 2020+			
LP.	Nr projektu w GPR	NAZWA PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY
1.	1	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
2.	3	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
3.	4	Droga do aktywności zawodowej Zmiana nazwy: Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na Start	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR
4.	13	Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną
5.	14	Bytomski Inkubator Przedsiębiorczości	Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej we współpracy z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową Zmiana podmiotu realizującego: Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa
6.	23	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw Zmiana nazwy: Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Podmiotowy System Finansowania	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną
7.	91	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Strzelców Bytomskich 16	Miasto Bytom/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
8.	94	Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu
9.	98	Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu	Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbiści Dom Misyjny

10.	100	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe	Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
11.	102	Program Terapii dla Młodzieży	Miasto Bytom/Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom (od 2017 r. Centrum Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom)
12.	103	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom	Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
13.	104	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	Miasto Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
14.	110	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku	Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
15.	113	Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu	Parafia Św. Jacka w Bytomiu
16.	114	Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap	Bytomskie Centrum Kultury

Źródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

Tabela 9. Brak informacji o stanie realizacji projektu

ZAŁ. NR 2 DO GPR. BYTOM 2020+			
LP.	Nr projektu w GPR	NAZWA PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY
1.	50	Rewitalizacja społeczna Dzielnicy Bobrek, Rozbark i Śródmieście	Fundacja Flexi Mind we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami
2.	58	Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Bytom
3.	65	Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej
4.	66	Bezpieczny senior	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Bytomskim Centrum Wsparcia i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej
5.	67	Opiekunowie są wśród nas	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej
6.	75	Umiem się uczyć	Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy Urzędem Miejskim i Euro-support

Źródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

Dodatkowo w zał. nr 2 do GPR. Bytom 2020+ wpisanych zostało 7 projektów, których szczegółowy stan realizacji przedstawia tabela nr 10. Tabela charakteryzuje projekty, dla których zgodnie z „Listą przedsięwzięć podstawowych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, jako źródło finansowania wskazano „źródła inne niż z RPO WSL 2014-2020”. Mimo, iż zgodnie z zapisami ww. załącznika finansowanie projektów nie dotyczyło RPO WSL 2014-2020 jeden z projektów pt. *Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego* decyzją Wnioskodawcy podzielony został na 4 etapy. W ramach etapu I Fundacja EC GENERATOR złożyła wniosek o dofinansowanie pt. **„GENERATOR KULTURY - utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej”**

w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs – **projekt został wybrany do dofinansowania.**

Projekt ubiegający się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. **Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki** został wybrany do dofinansowania (podpisano umowę o dofinansowanie – trwa realizacja rzeczowa), **podpisana została również umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt** dla projektu *Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną*, natomiast decyzją Wnioskodawcy nie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pt. *Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów* z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dodatkowo Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej realizująca projekt we współpracy z Miastem Bytom doprecyzowała, że inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 - 2020.

Tabela 10. Projekty finansowane z innych źródeł niż RPO WSL 2014-2020 (zgodnie z zał. nr 2 do GPR. Bytom 2020+)

ZAŁ. NR 2 DO GPR. BYTOM 2020+					STAN REALIZACJI (stan na marzec 2018 r.)
LP.	Nr projektu w GPR	NAZWA PROJEKTU	PODMIOT REALIZUJĄCY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
1.	80	Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (II)	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	PO WER 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakończona realizacja projektu
2.	120	Kompleksowa rewitalizacja złożona ze stref: 1. Strefa Seniora 2. Strefa aktywizacji młodych 3. Strefa dla najmłodszych 4. Strefa zieleni 5. Inkubator Przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na świadczenie usług dla osób starszych 6. Poradnia zdrowia psychicznego wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, współuzależnień i profilaktyki	Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM we współpracy z Gminą Bytom	środki prywatne	Wniosek o dofinansowanie w trakcie przygotowania
3.	121	Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego	Rezonator Spółka Akcyjna	środki prywatne	Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy. W ramach etapu I Fundacja EC GENERATOR złożyła wnioski o dofinansowanie pt. „ GENERATOR KULTURY - utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz

					<p>stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej” w ramach RPO WSL 2014-2020 EFRR z poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs.</p> <p>etap I - wniosek wybrany do dofinansowania</p>
4.	122	Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łągiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Miasto Bytom/Ośrodek Sportu i Rekreacji	POLiŚ 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego	<p>Umowa o dofinansowanie podpisana 22.12.2016 r.</p> <p>realizacja rzeczowa projektu</p>
5.	124	Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów	Miasto Bytom/Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego	<p>Projekt nie zostanie zrealizowany</p> <p>Decyzja uchylająca - uchwała Nr XXXIV/17/479/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 r.</p>
6.	125	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną	Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania	Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat	<p>Podpisana umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z dnia 20.03.2017. Wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną".</p>
7.	126	Budowa nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem przystosowania pomieszczeń i wyposażenia dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Miastem Bytom/Biuro Bezpieczeństwa Miasta	środki publiczne (budżet państwa)	<p>Ogłoszono przetarg na Generalnego wykonawcę robót budowlanych – 28.03.2018 r. unieważniono procedurę przetargową.</p> <p>Inwestycja realizowana zostanie w ramach Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 - 2020.</p>

Źródło: Załącznik do sprawozdania z realizacji GPR

4. Ocena stopnia aktualności zapisów GPR. Bytom 2020+

W celu uszczegółowienia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” dokonano oceny aktualności zapisów bytomskiego programu rewitalizacji. Ocena stopnia aktualności objęto rozdziały dotyczące:

- a) **lokalnych dokumentów programowych i strategicznych** – tab. 11;

Tabela 11. Dokumenty strategiczne, programowe i planistyczne nawiązujące do procesu rewitalizacji Bytomia

RODZAJ	TYTUŁ DOKUMENTÓW	DATA PRZYJĘCIA/ OPRACOWANIA	Ocena aktualności dokumentu
Dokumenty strategiczne	Strategia Rozwoju Miasta. Bytom 2020+	Uchwała Nr XXXVI/501/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r.	Dokument obowiązujący
	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bytomia na lata 2015-2020	Uchwała Nr XVIII/239/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 listopada 2015 r.	Dokument obowiązujący
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom	Uchwała Nr XXVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r. ze zmianą przyjętą uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. Załączniki do uchwały nr X/120/13 stanowią ujednoliconą wersję ww. Studium.	Dokument obowiązujący Dokument przyjęty dodatkowo ze zmianą przyjętą Uchwałą nr XXXVIII/485/17 z 27 lutego 2017 r.
Dokumenty programowe	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom na lata 2014-2019	Uchwała Nr XXIV/330/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r.	Dokument obowiązujący
	Program Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2014-2017	Uchwała Nr XXXI/425/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r.	Dokument obowiązujący W chwili obecnej Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków opracowuje nowy program opieki nad zabytkami.
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytomia na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019	Uchwała Nr IX/94/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r.	Dokument obowiązujący Dokument przyjęty dodatkowo ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr IX/121/07 z 25 kwietnia 2007 r. oraz Uchwałą Nr IX/122/07 z 25 kwietnia 2007 r.
Dokumenty planistyczne	Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)	Uchwała Nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.	Dokument obowiązujący
	Aktualizacja Studium wykonalności dla projektu pn. „Rewitalizacja starówki Bytomia – dziedzictwa kulturowego regionu – etap I”	Opracowano w listopadzie 2013 r.	Dokument obowiązujący

Źródło: „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, s. 6

- b) **diagnoza** – z weryfikacji zapisów rozdziału pt. „*Diagnoza*” w GPR. Bytom 2020+ wynika, że jest on aktualny, odzwierciedla aktualne uwarunkowania zewnętrzne, które się nie zmieniły od czasu, który jest opisany w programie rewitalizacji, w związku z czym nie wymaga on zmiany;
- c) **wizja, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych** – z weryfikacji zapisów rozdziału pt. „*Wizja, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych*” w GPR. Bytom 2020+ wynika, że jest on aktualny. Przesłanką do nie wnoszenia zmiany w niniejszym rozdziale jest fakt, że korekty nie wymaga rozdział dot. diagnozy;
- d) **przedsięwzięcia** – szczegółowa charakterystyka dot. przedsięwzięć rewitalizacyjnych została opisana w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania;
- e) **Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji** – uchwała dot. SSR została przyjęta uchwałą NR LX/797/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia na terenie Bytomia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji: nr 8 - Bobrek, nr 10 - Śródmieście, nr 12 - Rozbark i nr 13 - Śródmieście Północ. Dodatkowo zgodnie z zapisami GPR. Bytom 2020+ miasto Bytom nie planuje uchwalić miejscowego planu rewitalizacji;
- f) **Zarządzanie i monitorowanie** - szczegółowa charakterystyka dot. monitorowania GPR została opisana w rozdziale 2 niniejszego sprawozdania. Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich opracowało sprawozdanie z realizacji GPR. Bytom 2020+ w oparciu o zapisy programu rewitalizacji. W chwili obecnej system zarządzania i monitorowania nie wymaga zmiany.

Rozbieżności w „Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+” wynikają z przeprowadzonych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu (zarządzeniem nr 275/17 Prezydenta Bytomia z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu z późn. zm.) lub dodatkowo ze zmian wprowadzonych na etapie opracowywania poszczególnych dokumentów. Jednakże w związku z powyższymi zapisami niniejszego rozdziału i przeprowadzoną oceną stopnia aktualności zapisów bytomskiego programu rewitalizacji stwierdza się, że w obecnej chwili nie ma konieczności przeprowadzenia aktualizacji GPR. Bytom 2020+.

5. Podsumowanie

Monitoring bytomskiego programu rewitalizacji został przeprowadzony rok po przyjęciu uchwały Nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”. Na podstawie sprawozdań cząstkowych opracowano szczegółowe zestawienie przedsięwzięć charakteryzujące aktualny stan (na dzień 28.03.2018 r.) realizacji projektów rewitalizacyjnych, jak również wskazuje jakie zmiany dokonali Wnioskodawcy względem zgłoszonych do GPR. Bytom 2020+ w 2016 r. projektów m.in.:

- zmiana nazwy projektu;
- zmiana podmiotu realizującego;
- zmiana źródła finansowania;
- zmiana wartości projektu;
- zmiana okresu realizacji projektu;
- zmiana wskaźników projektu.

Ostatecznie spośród 127 projektów (w tym dla 6 projektów nie otrzymano informacji ze strony podmiotu realizującego o stanie jego przygotowania) **19 złożonych wniosków zostało wybranych do dofinansowania** (17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz 1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), **dla 7 z nich podpisana została umowa o dofinansowanie projektu – szczegółowe informacje przedstawione w tab. 8 i 10:**

- **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Strzelców Bytomskich 16** (Miasto Bytom/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) – RPO WSL;

- **Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu** (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu) – RPO WSL;
- **Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu** (Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbiści Dom Misyjny) – RPO WSL;
- **Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej** (Miasto Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu) – RPO WSL;
- **Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku** (Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej) – RPO WSL;
- **Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (II)** (Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu) – POWER;
- **Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki** (Miasto Bytom/Ośrodek Sportu i Rekreacji) – POLiŚ.

Dodatkowo podpisana została umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt dla projektu **Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną**, także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ma zagwarantowane środki pieniężne na realizację zadania pt.: **Budowa nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem przystosowania pomieszczeń i wyposażenia dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego** z Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 – 2020 – wyróżnione kolorem niebieskim w tab. nr 10.

Przeprowadzony monitoring/sprawozdawczość jednoznacznie pozwala ocenić stopień realizacji/wdrażania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – czy wniosek jest w trakcie przygotowania, czy wniosek złożono lub nie oraz czy projekt będzie realizowany. Służy zagwarantowaniu prawidłowo prowadzonego procesu rewitalizacji. Opracowane zestawienie tabelaryczne wskazuje, w jakiej kolejności składane są wnioski o dofinansowanie, jednocześnie pokazuje, dla których projektów zbliżają się ostateczne terminy złożenia wniosków.

Jednoznacznie po przeprowadzeniu oceny stopnia wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz aktualności zapisów GPR. Bytom 2020+ stwierdza się, że w obecnej chwili nie ma konieczności przeprowadzenia aktualizacji GPR. Bytom 2020+.

Spis rysunków

Rysunek 1. Uchwała Rady Miejskiej – GPR. Bytom 2020+	4
Rysunek 2. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (Zał. Nr 1 do GPR. Bytom 2020+).....	5
Rysunek 3. Wycinek – monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	9

Spis tabel

Tabela 1. Ludność obszaru rewitalizacji (2015 r.)	3
Tabela 2. Powierzchnia obszaru rewitalizacji.....	3
Tabela 3. Harmonogram monitoringu „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”	6
Tabela 4. Wskaźniki realizacji celów GPR.....	7
Tabela 5. Projekty finansowane z RPO WSL 2014-2020 (zgodnie z zał. nr 2 do GPR. Bytom 2020+)	10
Tabela 6. Projekty, dla których podmioty realizujące wycofały się z realizacji.....	10
Tabela 7. Projekty w trakcie przygotowania	11
Tabela 8. Projekty wybrane do dofinansowania	12
Tabela 9. Brak informacji o stanie realizacji projektu.....	13
Tabela 10. Projekty finansowane z innych źródeł niż RPO WSL 2014-2020 (zgodnie z zał. nr 2 do GPR. Bytom 2020+).....	14
Tabela 11. Dokumenty strategiczne, programowe i planistyczne nawiązujące do procesu rewitalizacji Bytomia	16
